

Proponente: **BLUESTATE**

Tipologia iniziativa: **ACQUISTO - VALORIZZAZIONE - VENDITA**

Comune: **Roma**

**6. EDILIZIA**

Indirizzo: **Via Tortolini Barnaba, 30**

**Avanzamento cantiere**

**SAL complessivo lavorazioni**


		%	
1	<b>Massetti e impermeabilizzazioni</b>	%	100%
2	<b>Murature e tavolati</b>	%	100%
3	<b>Intonaci, rasature e tinteggiature</b>	%	70%
4	<b>Pavimenti e rivestimenti</b>	%	70%
5	<b>Serramenti interni ed esterni</b>	%	40%
6	<b>Impianti di riscaldamento</b>	%	90%
7	<b>Impianto idrosanitario e gas</b>	%	90%
8	<b>Impianto elettrico</b>	%	70%
9	<b>Sistemazione Cantiere</b>	%	85%
<b>TOTALE:</b>			<b>80%</b>

**Descrizione stato avanzamento lavori**

Si segnala che il cantiere risulta allineato al cronoprogramma stilato. Le ricostruzioni sono terminate in tutti e tre gli interni. Prossimamente avranno inizio i lavori di tinteggiatura e completamento dei serramenti e rivestimenti. Si può affermare uno stato di avanzamento complessivo del cantiere pari al 80%

IMPRESE APPALTATE: INNOVATIS RISTRUTTURAZIONI S.R.L.

**Foto di Cantiere**

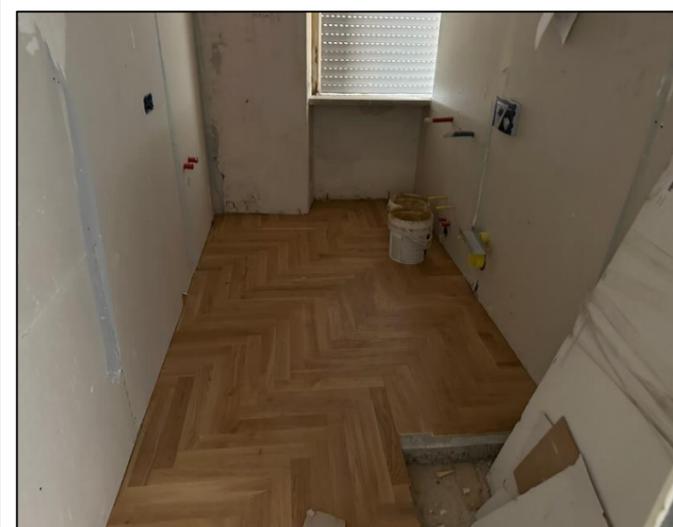

**SAL:**

Date di monitoraggio SAL del cantiere previste e fornite dal proponente.

DATE		
	<del>mag-23</del>	<del>lug-23</del>

**Analisi documentale**

TITOLO ABILITATIVO: CILA CB 2023/50222 del 13/04/2023
